Objekts: Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lelvārdē 3.kārta
Projekta Nr. 5.3.1.0 / 17 / I / 008.

BŪVDARBU IZPILDES KALENDARAIS LAIKA GRAFIKS

ID	NOSAUKUMS	ILGUMS	Start	Finish
1	**Lielvārdes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 3.kārta / Būvniecīb**	**485 days**	**Mon 18.05.20**	**Fri 25.03.22**
2	Līguma noslēgšana	0 days	Mon 18.05.20	Mon 18.05.20
3	Darbu izpildes nodrošinājuma iesniegšana	12 days	Mon 18.05.20	Tue 02.06.20
4	Apdrošināšana	12 days	Tue 19.05.20	Wed 03.06.20
5	Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde	12 days	Mon 18.05.20	Tue 02.06.20
6	**Tehniskā projekta aktualizēšana**	25 days	Wed 03.06.20	Tue 07.07.20
7	**Būvatļaujas saņemšana/Būvdarbu uzsākšana**	0 days	Thu 09.07.20	Thu 09.07.20
8	Darbu uzsākšanas datums	0 days	Fri 10.07.20	Fri 10.07.20
9	Mobilizācija,materiālu piegāde, rakšanas atļaujas izņemšana	20 days	Fri 10.07.20	Thu 06.08.20
10	**ŪKT TĪKLU REKONSTRUKCIJA 1.daļa**	**344 days**	**Fri 07.08.20**	**Wed 01.12.21**
11	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S LIEPU IELĀ (922 m)	58 days	Wed 12.08.20	Thu 25.02.21
12	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 PUŠKINA IELĀ (1139 m)	84 days	Fri 25.09.20	Wed 20.01.21
13	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 DRAUDZĪBAS IELĀ (445 m)	25 days	Fri 26.02.21	Thu 01.04.21
14	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 VIDUS IELĀ (293 m)	15 days	Fri 02.04.21	Thu 22.04.21
15	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 ZIEDU IELĀ (108 m)	10 days	Fri 23.04.21	Thu 06.05.21
16	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S UZVARAS IELĀ (1015 m)	70 days	Fri 07.05.21	Thu 12.08.21
17	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 ĶIRŠU IELĀ (738 m)	55 days	Fri 13.08.21	Thu 28.10.21
18	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 MIERA IELĀ (1366 m)	85 days	Mon 05.10.20	Fri 29.01.21
19	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 PĻAVU IELĀ (226 m)	20 days	Mon 01.02.21	Fri 26.02.21
20	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 PRIEŽU IELĀ (206 m)	12 days	Mon 01.03.21	Tue 16.03.21
21	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 EGĻU IELĀ (146 m)	12 days	Wed 17.03.21	Thu 01.04.21
22	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 LAUKU IELĀ (1004 m)	55 days	Fri 02.04.21	Thu 17.06.21
23	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-STACIJAS UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S STACIJAS IELĀ (978 m)	55 days	Fri 18.06.21	Thu 02.09.21
24	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 PUTNU IELĀ (828 m)	58 days	Fri 03.09.21	Tue 23.11.21
25	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-MEŽA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S MEŽA IELĀ (1726 m)	115 days	Mon 07.12.20	Fri 14.05.21
26	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 REMBATES IELĀ (1561 m)	100 days	Mon 17.05.21	Fri 01.10.21
27	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 NĀKOTNES IELĀ (372 m)	30 days	Mon 04.10.21	Fri 12.11.21
28	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-KASTAŅU UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S KASTAŅU IELĀ (447 m)	26 days	Fri 07.08.20	Fri 11.09.20
29	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S ZVAIGŽŅU IELĀ (1217 m)	90 days	Mon 14.09.20	Thu 12.08.21
30	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-PUMPURA UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S PUMPURA IELĀ (2614 m)	190 days	Mon 19.10.20	Thu 04.11.21
31	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 ZAĶU IELĀ (275 m)	26 days	Mon 24.08.20	Mon 28.09.20
32	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KSS-MEDNIEKU UN KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S MEDNIEKU IELĀ (624 m)	80 days	Mon 05.10.20	Fri 22.01.21
33	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 LIEPZIEDU IELĀ (104 m)	20 days	Thu 11.03.21	Wed 07.04.21
34	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 LAKSTĪGALU IELĀ (394 m)	45 days	Thu 08.04.21	Wed 09.06.21
35	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 LĪČU IELĀ (402 m)	45 days	Mon 25.01.21	Fri 26.03.21
36	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 OZOLU IELĀ (1044 m)	65 days	Thu 10.06.21	Wed 08.09.21
37	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 ZAĻĀ IELĀ (416 m)	40 days	Thu 09.09.21	Wed 03.11.21
38	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 SMILŠU IELĀ (269 m)	20 days	Thu 04.11.21	Wed 01.12.21
39	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 AKMEŅU IELĀ (38 m)	12 days	Fri 05.11.21	Mon 22.11.21
40	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1, KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS K1S NO ESOŠĀ "AVOTU MASĪVA"	40 days	Mon 14.06.21	Fri 06.08.21
41	**IELAS SEGUMU ATJAUNOŠANA**	350 days	Mon 05.10.20	Fri 04.02.22
42	0,4kV KABEĻLĪNIJAS KSS MEDNIEKU IELĀ	20 days	Mon 30.11.20	Fri 25.12.20
43	0,4kV KABEĻLĪNIJAS KSS KASTAŅU IELĀ	20 days	Mon 28.12.20	Fri 22.01.21
44	0,4kV KABEĻLĪNIJAS LAKSTĪGALU IELĀ	20 days	Mon 25.01.21	Fri 19.02.21
45	0,4kV KABEĻLĪNIJAS KSS MEŽA IELĀ	20 days	Mon 22.02.21	Fri 19.03.21
46	0,4kV KABEĻLĪNIJAS KSS STACIJAS IELĀ	20 days	Mon 22.03.21	Fri 16.04.21
47	**UKT tīklu projektēšana un būvdarbi II daļa**	**235 days**	**Mon 31.08.20**	**Fri 23.07.21**
48	Būvdarbu ieceres dokumentācijas sagatavošana, būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība kanalizācijas tīklu izbūvei	110 days	Mon 31.08.20	Fri 29.01.21
49	Kanalizācijas tīklu izbūve	50 days	Mon 01.03.21	Fri 07.05.21
50	Kanalizācijas spiedvadu izbūve	30 days	Mon 10.05.21	Fri 18.06.21
51	Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve	25 days	Mon 21.06.21	Fri 23.07.21
52	Izpilddokumentācijas sagatavošana	360 days	Mon 07.09.20	Fri 21.01.22
53	Objekta nodošana ekspluatācijā	45 days	Mon 24.01.22	Fri 25.03.22

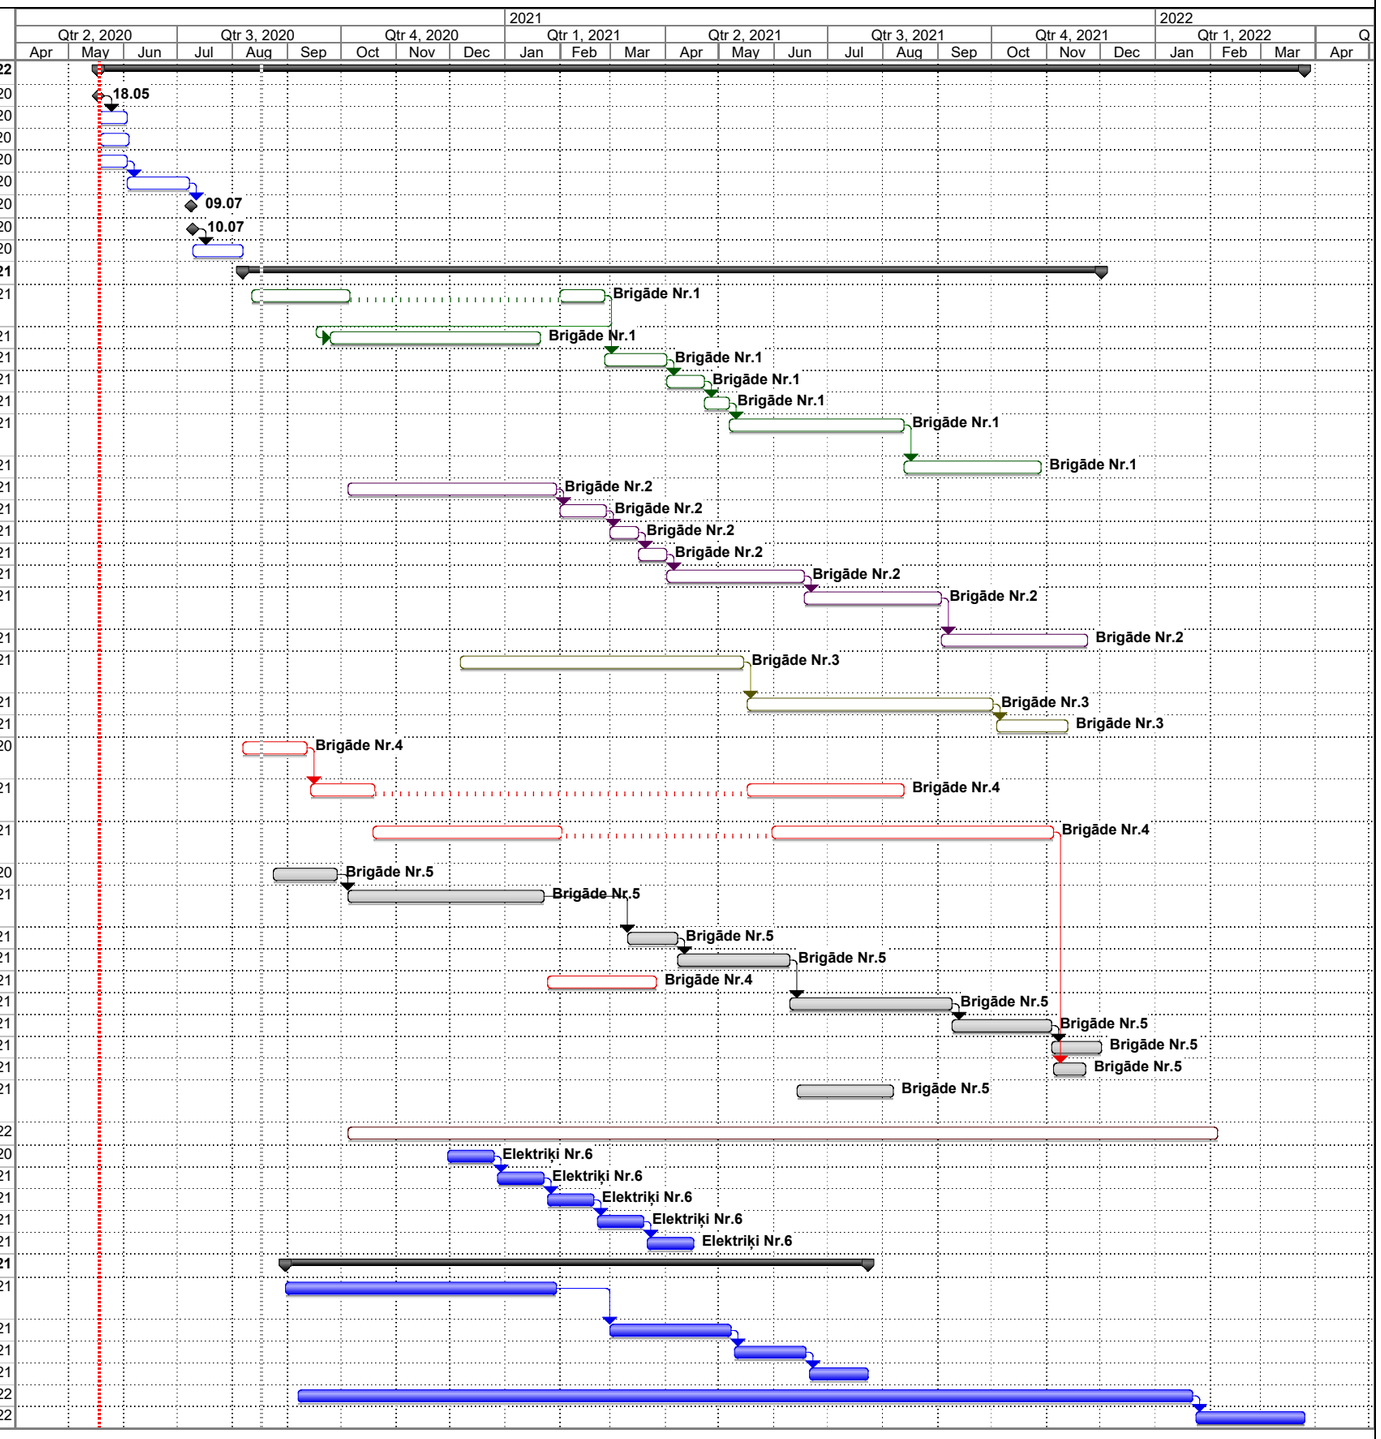

Project: Laika grafiks_Lielvārdes UKT_
Date: Mon 17.08.20

Task | Split | Progress | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Deadline
